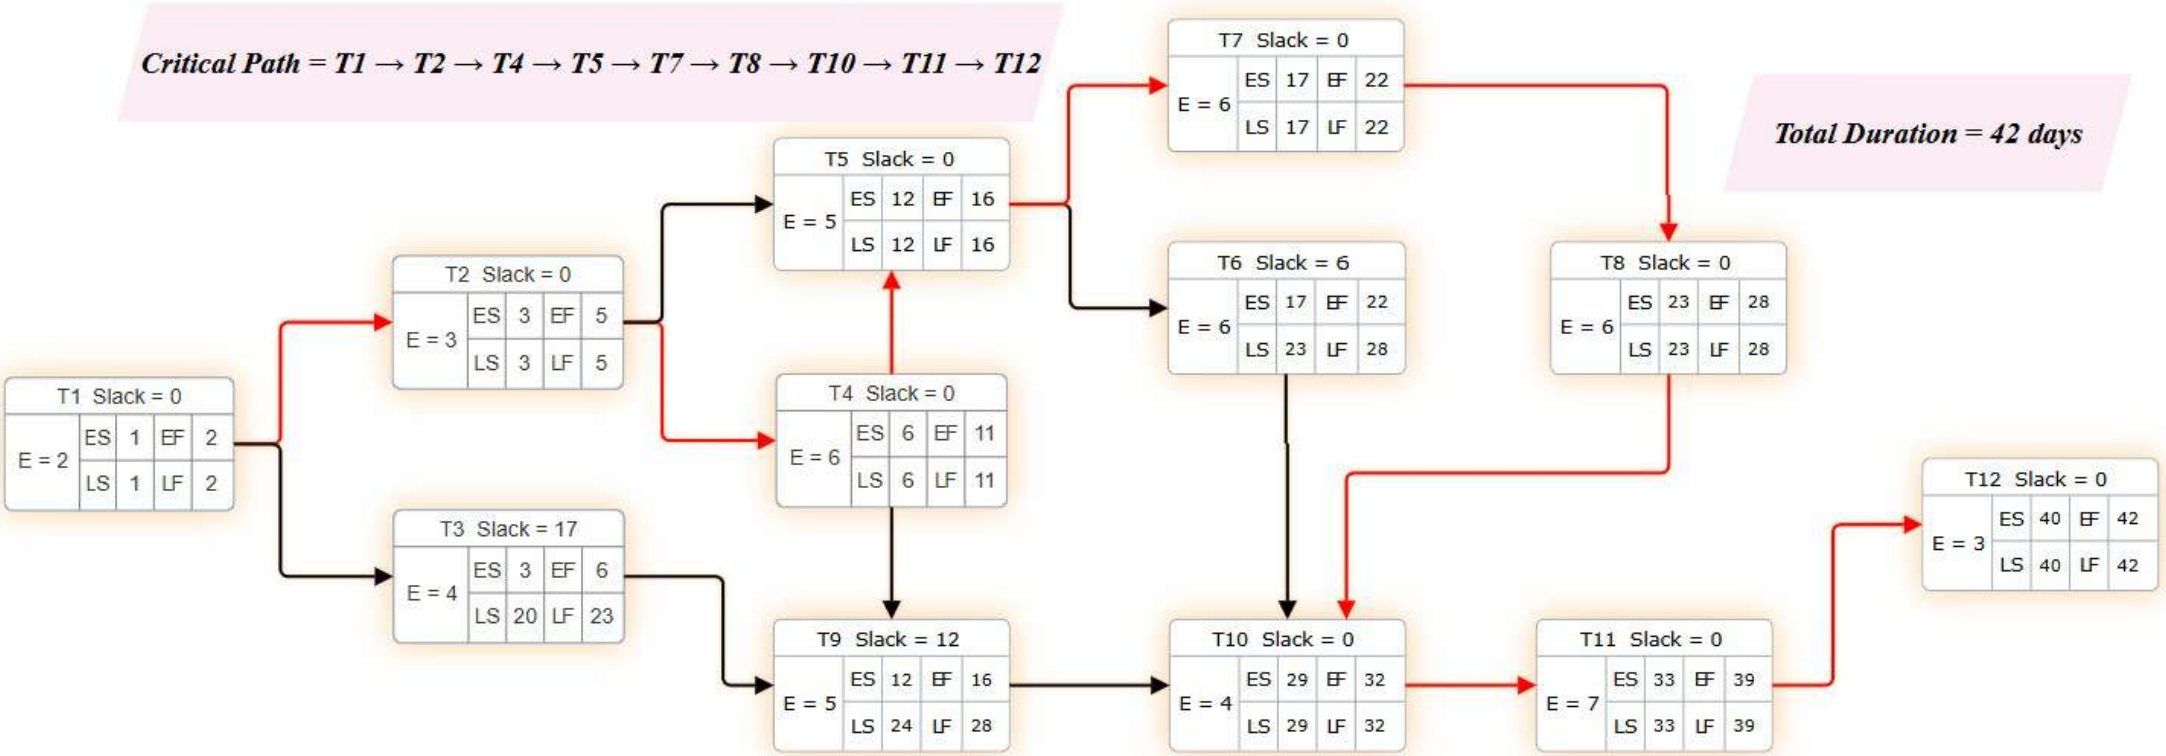
Critical Path = T1 → T2 → T4 → T5 → T7 → T8 → T10 → T11 → T12
Total Duration = 42 days
T1 Slack = 0
E = 2 ES 1 EF 2 LS 1 LF 2
T2 Slack = 0
E = 3 ES 3 EF 5 LS 3 LF 5
T3 Slack = 17
E = 4 ES 3 EF 6 LS 20 LF 23
T4 Slack = 0
E = 6 ES 6 EF 11 LS 6 LF 11
T5 Slack = 0
E = 5 ES 12 EF 16 LS 12 LF 16
T6 Slack = 6
E = 6 ES 17 EF 22 LS 23 LF 28
T7 Slack = 0
E = 6 ES 17 EF 22 LS 17 LF 22
T8 Slack = 0
E = 6 ES 23 EF 28 LS 23 LF 28
T9 Slack = 12
E = 5 ES 12 EF 16 LS 24 LF 28
T10 Slack = 0
E = 4 ES 29 EF 32 LS 29 LF 32
T11 Slack = 0
E = 7 ES 33 EF 39 LS 33 LF 39
T12 Slack = 0
E = 3 ES 40 EF 42 LS 40 LF 42
